

Suivi de Projets - Sanitoral



SANITORAL




Product Strategy Canvas



Rédacteur	Matthieu Verclytte, Data Analyst, ESN Data	Date	06/02/2025	Nom du client	Sanitoral
Nom du tableau de bord : SUIVI DE PROJET		Objectif du dashboard : Fournir un outil interactif permettant aux directeurs (général, régionaux et pays) d'évaluer les performances des différents projets (IT et Marketing), de leur secteur, selon 3 critères : les coûts, les délais, et les livrables. (alertes pour un dépassement de 15% du prévisionnel)			
Utilisateurs	Stories /User Cases				
Directeur général (DG)	UC1 : En tant que DG, je veux pouvoir suivre la performance globale de tous les projets, afin d'avoir une vue d'ensemble. =>VUE GLOBALE (Recap bilan au dessus carte)	UC2 : En tant que DG, Je souhaite pouvoir voir la performance par région , afin de contacter les DR si nécessaire. => VUE GLOBALE (Filtre région ou bilan)	UC3 : En tant que DG, Je veux être alerté lors des écarts de performance significatifs des projets afin de décider de l'arrêt ou de la poursuite des projets =>VUE GLOBALE Secteurs +VUE PROJET		
Directeur régional (DR)	UC4 : En tant que DR, je veux pouvoir suivre la performance globale des projets de ma région afin d'avoir une vue d'ensemble =>VUE GLOBALE (Recap bilan au dessus carte)	UC5 : En tant que DR, je veux être alerté sur les projets de ma région en cas d'écart de performance afin de pouvoir intervenir auprès du directeur pays. =>VUE GLOBALE Secteurs +VUE PROJET	UC6 : En tant que DR, je veux pouvoir suivre les projets de ma région , afin de m'assurer de la bonne organisation des projets de ma région. =>VUE PROJET		
Directeur Pays (DP)	UC7 : En tant que DP, je veux pouvoir suivre la performance globale des projets de mon pays afin d'avoir une vue d'ensemble =>VUE GLOBALE (Recap bilan au dessus carte)	UC8 : En tant que DP, je veux être alerté sur les projets de mon pays en cas d'écart de performance afin de pouvoir intervenir. =>VUE GLOBALE Secteurs+Vue projet	UC9 : En tant que DP, je veux avoir une vision sur les indicateurs des projets de mon pays afin de pouvoir prendre les mesures correctives sur les projets. =>VUE PROJET		

Modèle de données

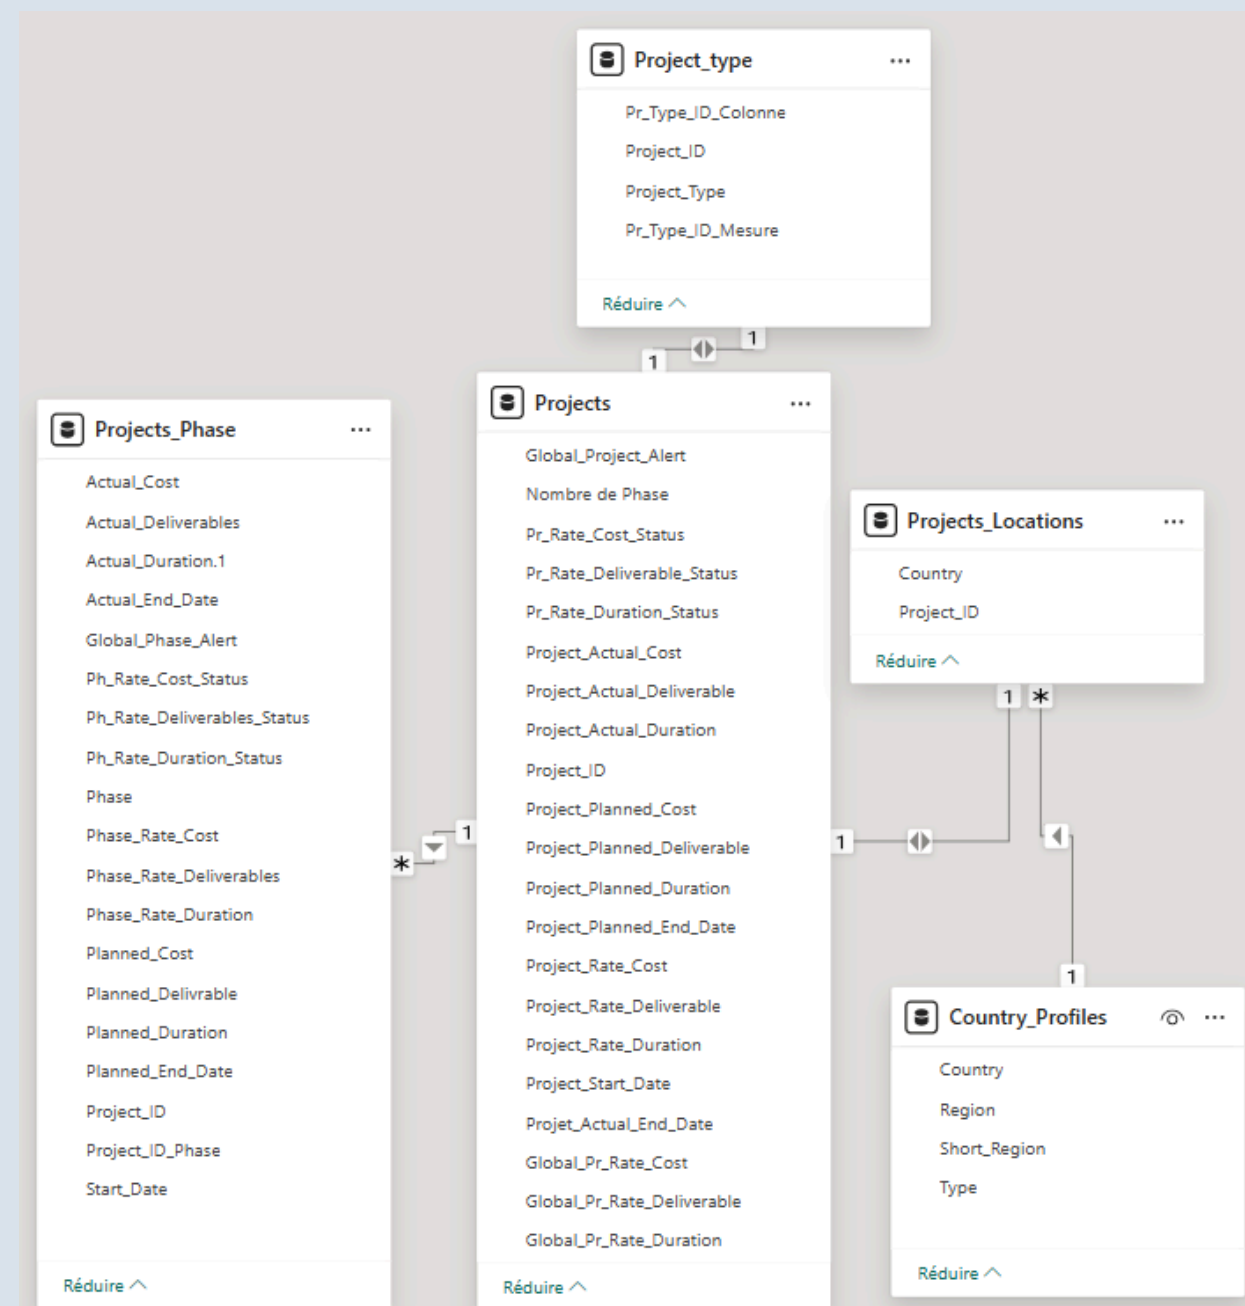

Les Entités

- ◆ **1. Entité Projects_Phase**
 - L'Entité Projects_Phase est issue de la feuille Project_plans , et joint également les données des feuilles Actual_Cost, Actual_Duration, Actual_Deliverable.
 - Elle regroupe toutes les informations concernant les Phases des projets, avec pour identifiant Project_ID_Phase
- ◆ **2. Entité Projects**
 - L'entité Projects est l'entité principale de ce fichier. Elle provient d'une duplication de l'Entité Projects_Phase, agrégée par Projet.
 - Elle regroupe toutes les informations concernant les Projets dans leur globalité, avec pour identifiant Project_ID
- ◆ **3. Entité Project_Type**
 - L'entité Project_Type provient de la feuille Project type et correspond à une table de liaison des Type de projets (IT ou Marketing).
- ◆ **4. Entité Project_Locations**
 - L'entité Project_Locations provient de la feuille du même nom et correspond à une table de liaison des Pays des projets.
- ◆ **5. Entité Country_Profiles**
 - L'entité Country_Profiles provient de la feuille du même nom et détail les informations des pays (notamment leur région)

Remarque :

- Le modèle est consultable via l'onglet à gauche Vue de modèle
- Les données sont consultables via l'onglet à gauche Affichage Table

Utilisation du DashBoard

Les principales pages :

- ♦ **1. VUE GLOBALE :**
 - La Vue Globale permet d'avoir une vue d'ensemble des retards selon les 3 critères (Coûts, Durée, Livrables)
 - Les dépassements de plus de 15% sont signalés en rouge
 - Différents filtres permettent d'affiner les informations au sein du Dashboard. Il est possible d'en ajouter dans la partie Filtre à droite.
 - Les graphiques sont interactifs n'hésitez pas à les explorer
 - Il est notamment possible d'effectuer une extraction des données, concernées par un segment d'alerte via un clic droit/Extraire sur la partie concernée. Puis un export en fichier Csv est possible
 - Utilisation de la carte : Pour une étude intra régionale ou pays, nous vous conseillons descendre dans la hiérarchie au niveau pays .
 - Pour une vue détaillée des origines des alertes par projet, nous vous conseillons de passer en VUE PROJET
 - Des graphiques complémentaires sont présents sous la carte afin de compléter les analyses par Région/Par Pays et d'étudier les phases
 - Un outil de Question/Réponse permet d'obtenir plus d'indicateurs à la demande, ou de graphiques simples.
- ♦ **2. VUE PROJET :**
 - Un premier tableau permet de consulter le détail des projets et de leurs dépassements pour une meilleur compréhension des alertes.
 - Les filtres permettent de sélectionner la Région/Pays et le type d'alerte à étudier.
 - Un second tableau permet de consulter le détail des phases des projets concernés.

♦ **3. Analyses Complémentaires :**
Afin de répondre à la demande d'éléments d'analyse, une page d'analyse complémentaire a été créée, avec des graphiques et analyse des influenceurs par Type (IT/Marketing), Region et Type de phases.

- ♦ **4. Diagramme de GANTT :**
 - Une page permet l'affichage des projets sous forme de Diagramme de Gantt
- ♦ **5. ROLES :**
 - Des Rôles sont définis et permettent de restreindre l'accès aux données de son secteur :
 - Directeur Général : accès à toutes les données
 - Directeur Régional : accès aux données de la région dont il est responsable
 - Directeur Pays : accès aux données du pays dont il est responsable
- ♦ **6. MISE A JOUR DES DONNEES :**
 - voir le guide opératoire ci-dessous



Procédure de Mise à jour des données

Étapes à suivre :

- ♦ **1. Ouvrir Power BI**
 - Lancez Power BI Desktop.
 - Ouvrez le fichier Power BI contenant votre tableau de bord.
- ♦ **2. Remplacer l'ancien fichier par le nouveau**
 - Assurez-vous que le nouveau fichier "**Donnees_Sanitoral.xlsx**" est enregistré au même emplacement que l'ancien.
 - Remplacez l'ancien fichier par la nouvelle version (même nom et même format).
- ♦ **3. Actualiser les données dans Power BI**
 - Dans Power BI, cliquez sur l'onglet **Accueil**.
 - Cliquez sur **Actualiser**.
 - Power BI mettra à jour automatiquement les données en appliquant les transformations déjà configurées dans Power Query.
- ♦ **4. Vérifier les mises à jour**
 - Consultez les tableaux et graphiques pour vérifier que les nouvelles données sont bien intégrées.
 - Les données sont également consultables via l'onglet à gauche Affichage Table
 - Si une erreur apparaît, vérifiez que le fichier est bien structuré comme l'original (mêmes colonnes et format).
- ♦ **5. Enregistrer et publier (si nécessaire)**
 - Une fois la mise à jour terminée, enregistrez votre fichier Power BI.
 - Si vous utilisez Power BI Service, cliquez sur **Publier** pour mettre à jour le tableau de bord en ligne.

Remarque importante :

- **Ne modifiez pas les noms de colonnes** dans le fichier Excel, sinon Power BI ne reconnaîtra plus les données.
- Si vous devez changer l'emplacement du fichier, vous devrez **modifier la source des données** dans Power BI.



VUE GLOBALE

Projets débutés entre le :

01/01/2018

31/05/2020

Projets achevés entre le :

20/07/2018

03/06/2022

Project_Type

Tout

Region

Tout






Country

Tout



104


Nombre de Projets

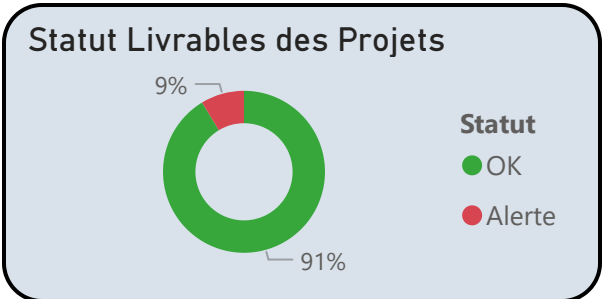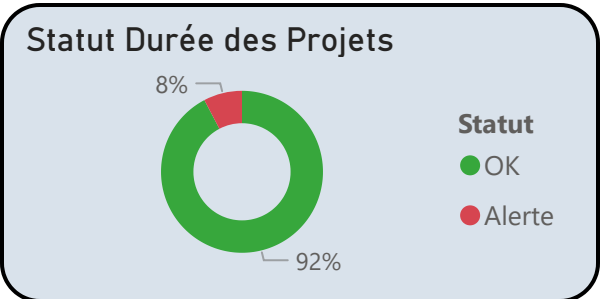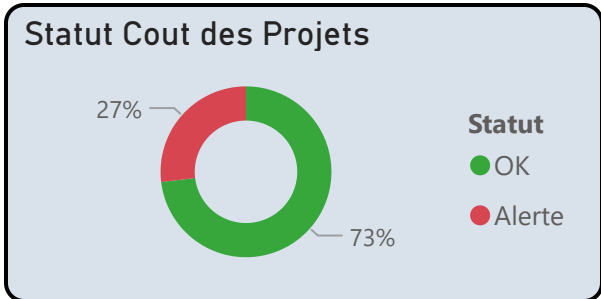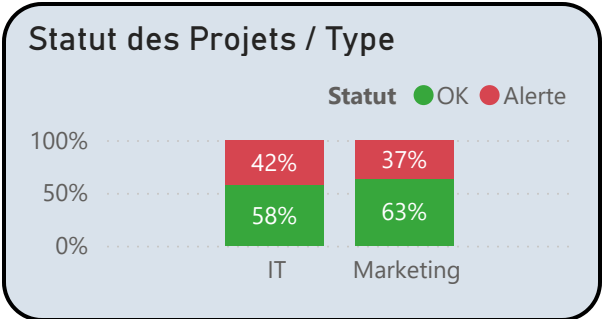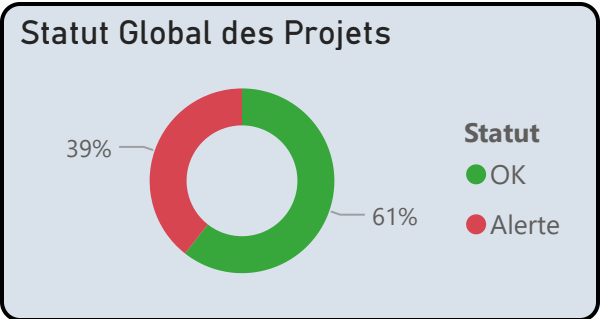









Global Planned Cost	Global Actual Cost	Global Rate Cost
56 108 000	60 200 800	107,29 %

Global Planned Duration	Global Actual Duration	Global Rate Duration
52 722	45 641	86,57 %





Global Planned Deliverable	Global Actual Deliverable	Global Rate Deliverable
8 735	7 819	89,51 %

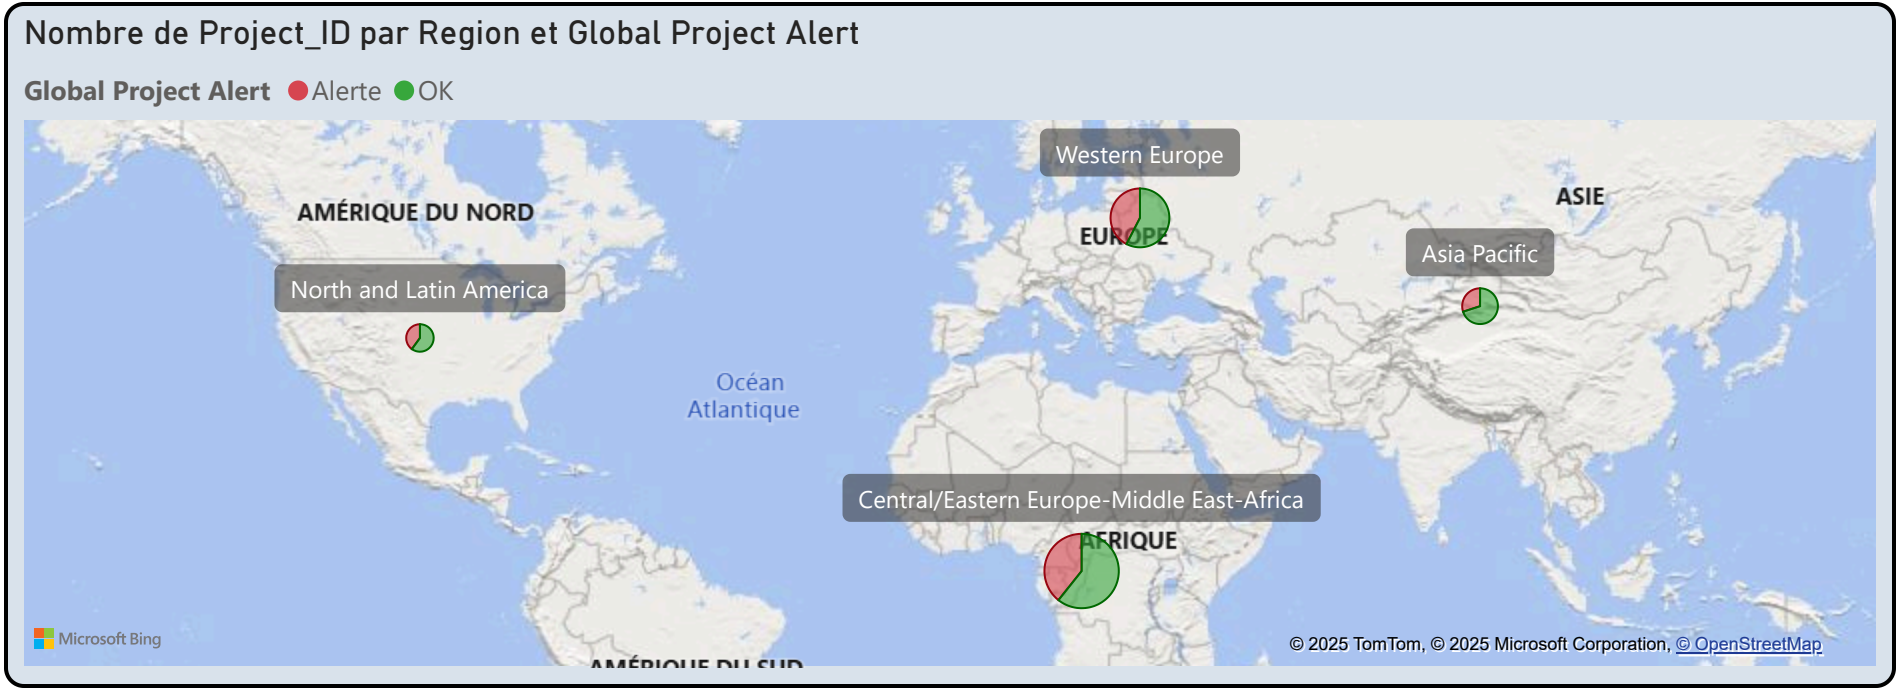





Bilan Statut Projet /Région /Pays

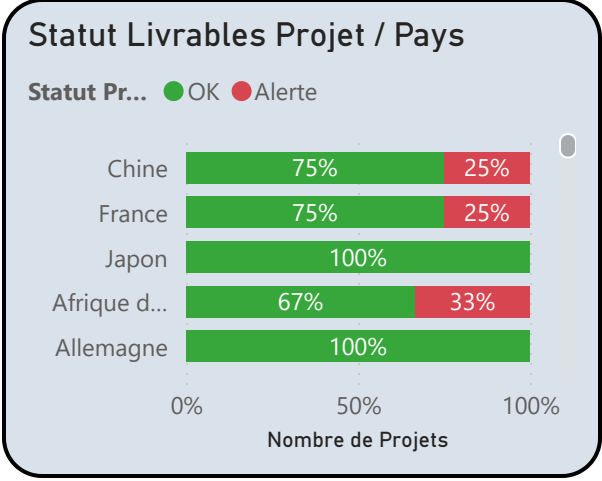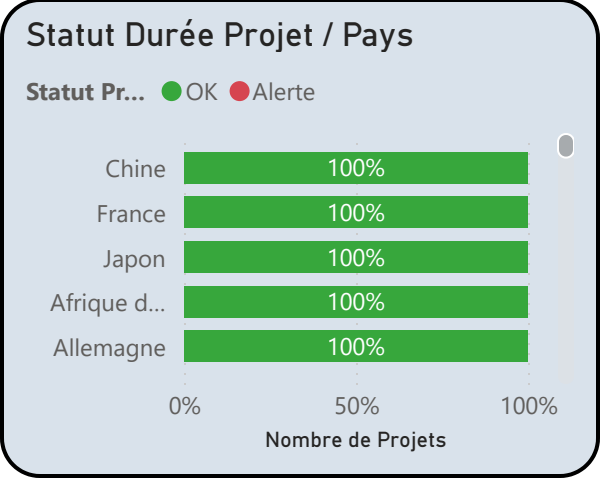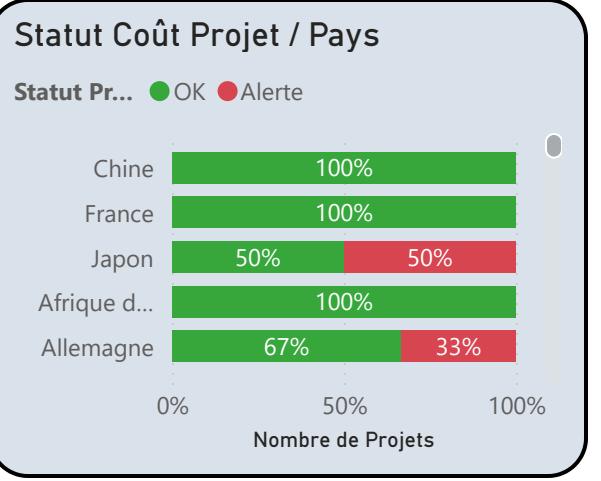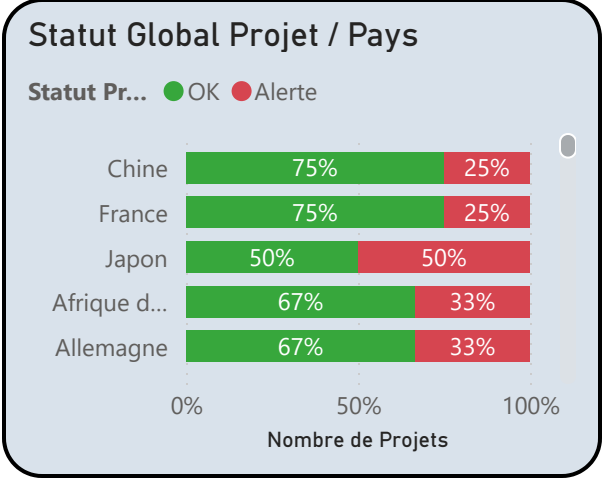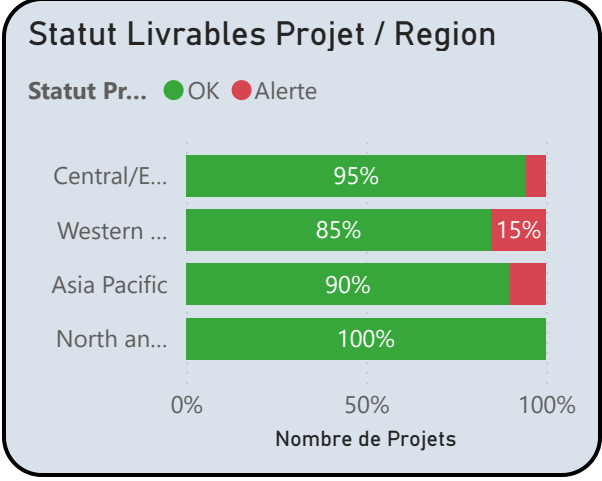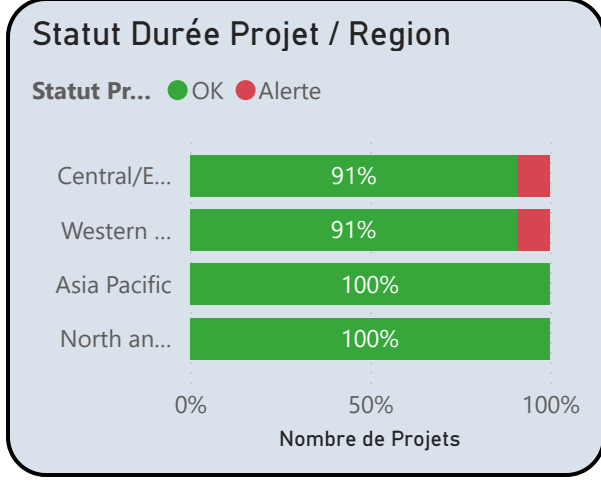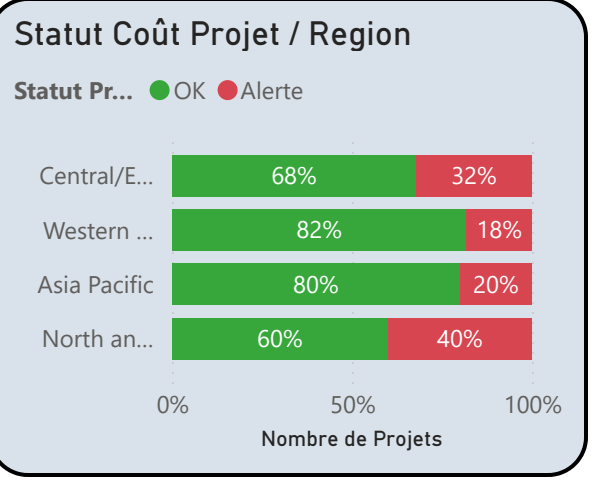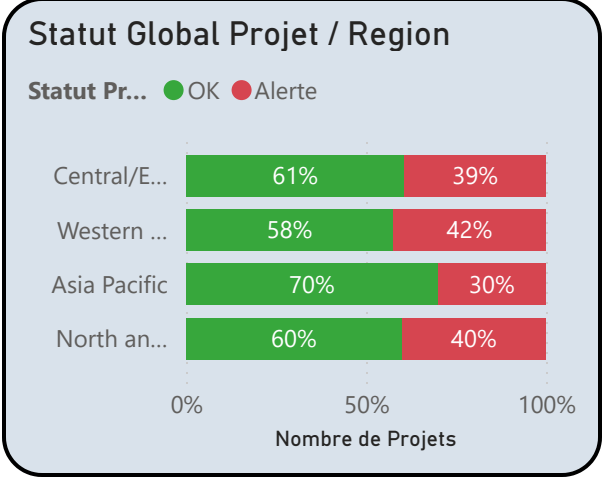


Bilan Statut Phases

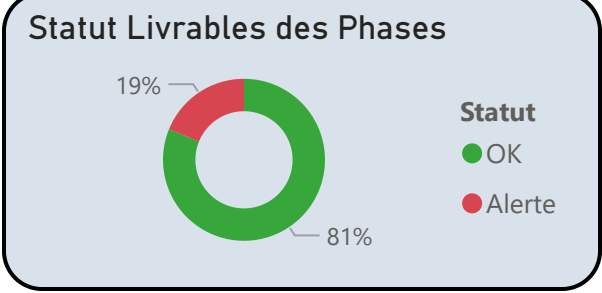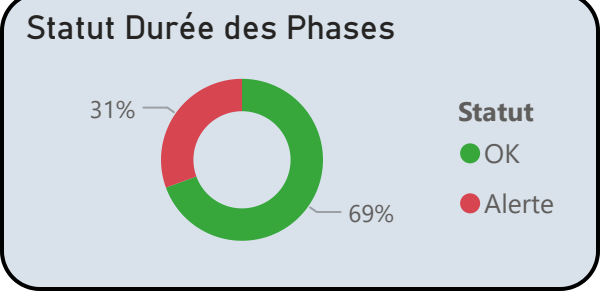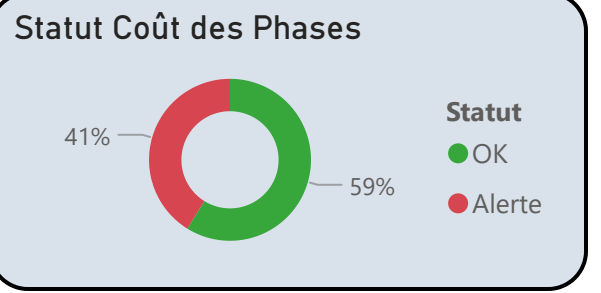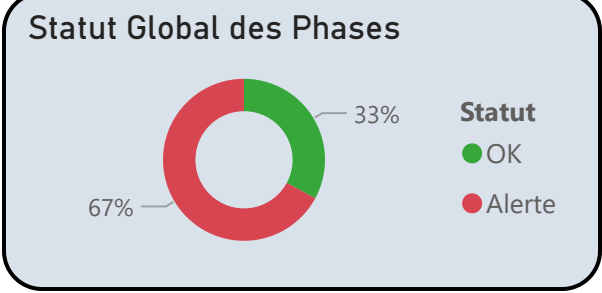

Bilan Statut Phases/Type de Phase

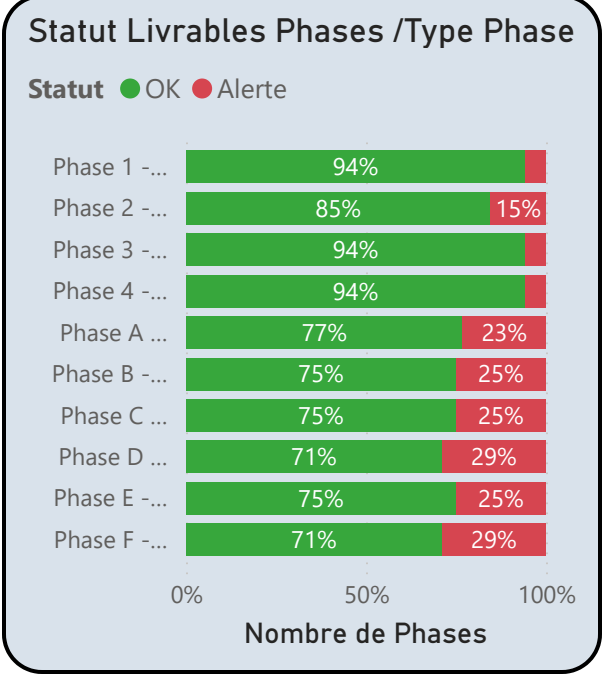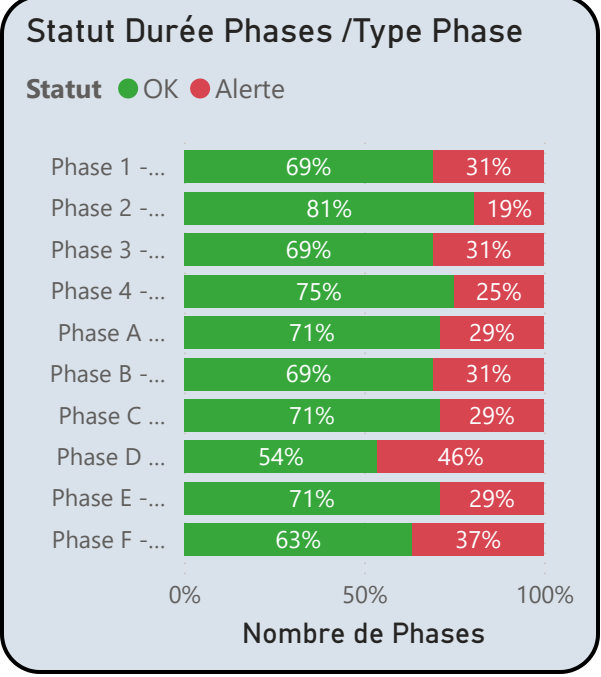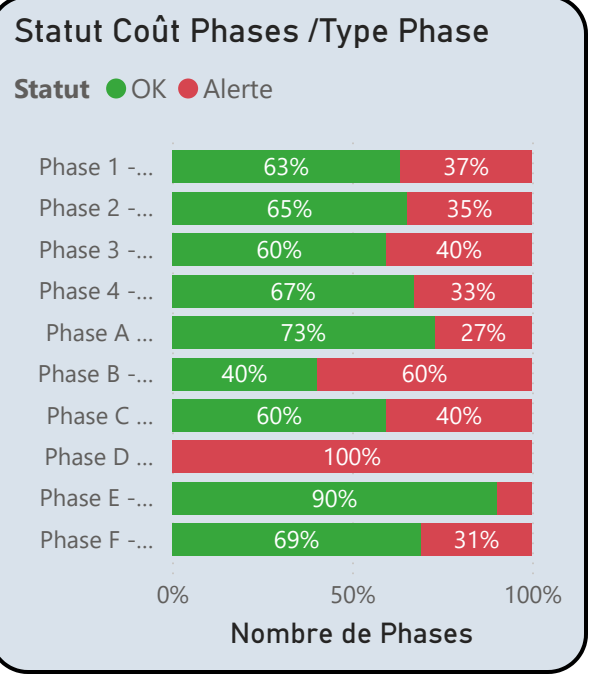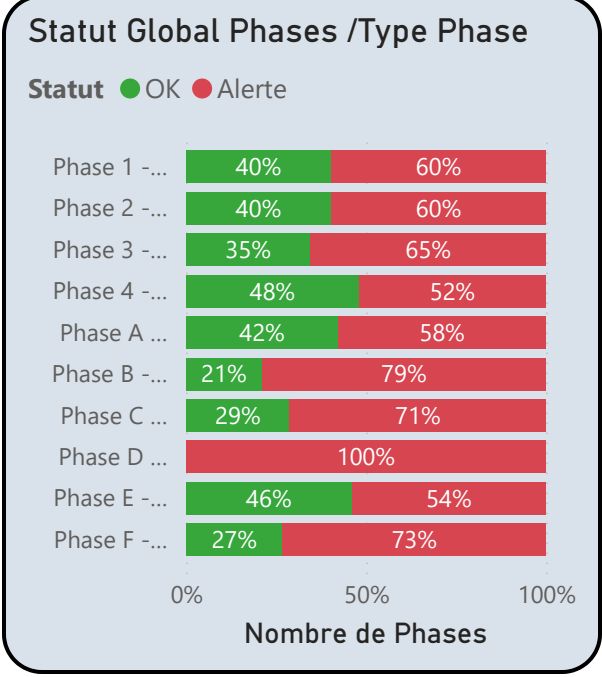

Posez votre question pour compléter ces informations :

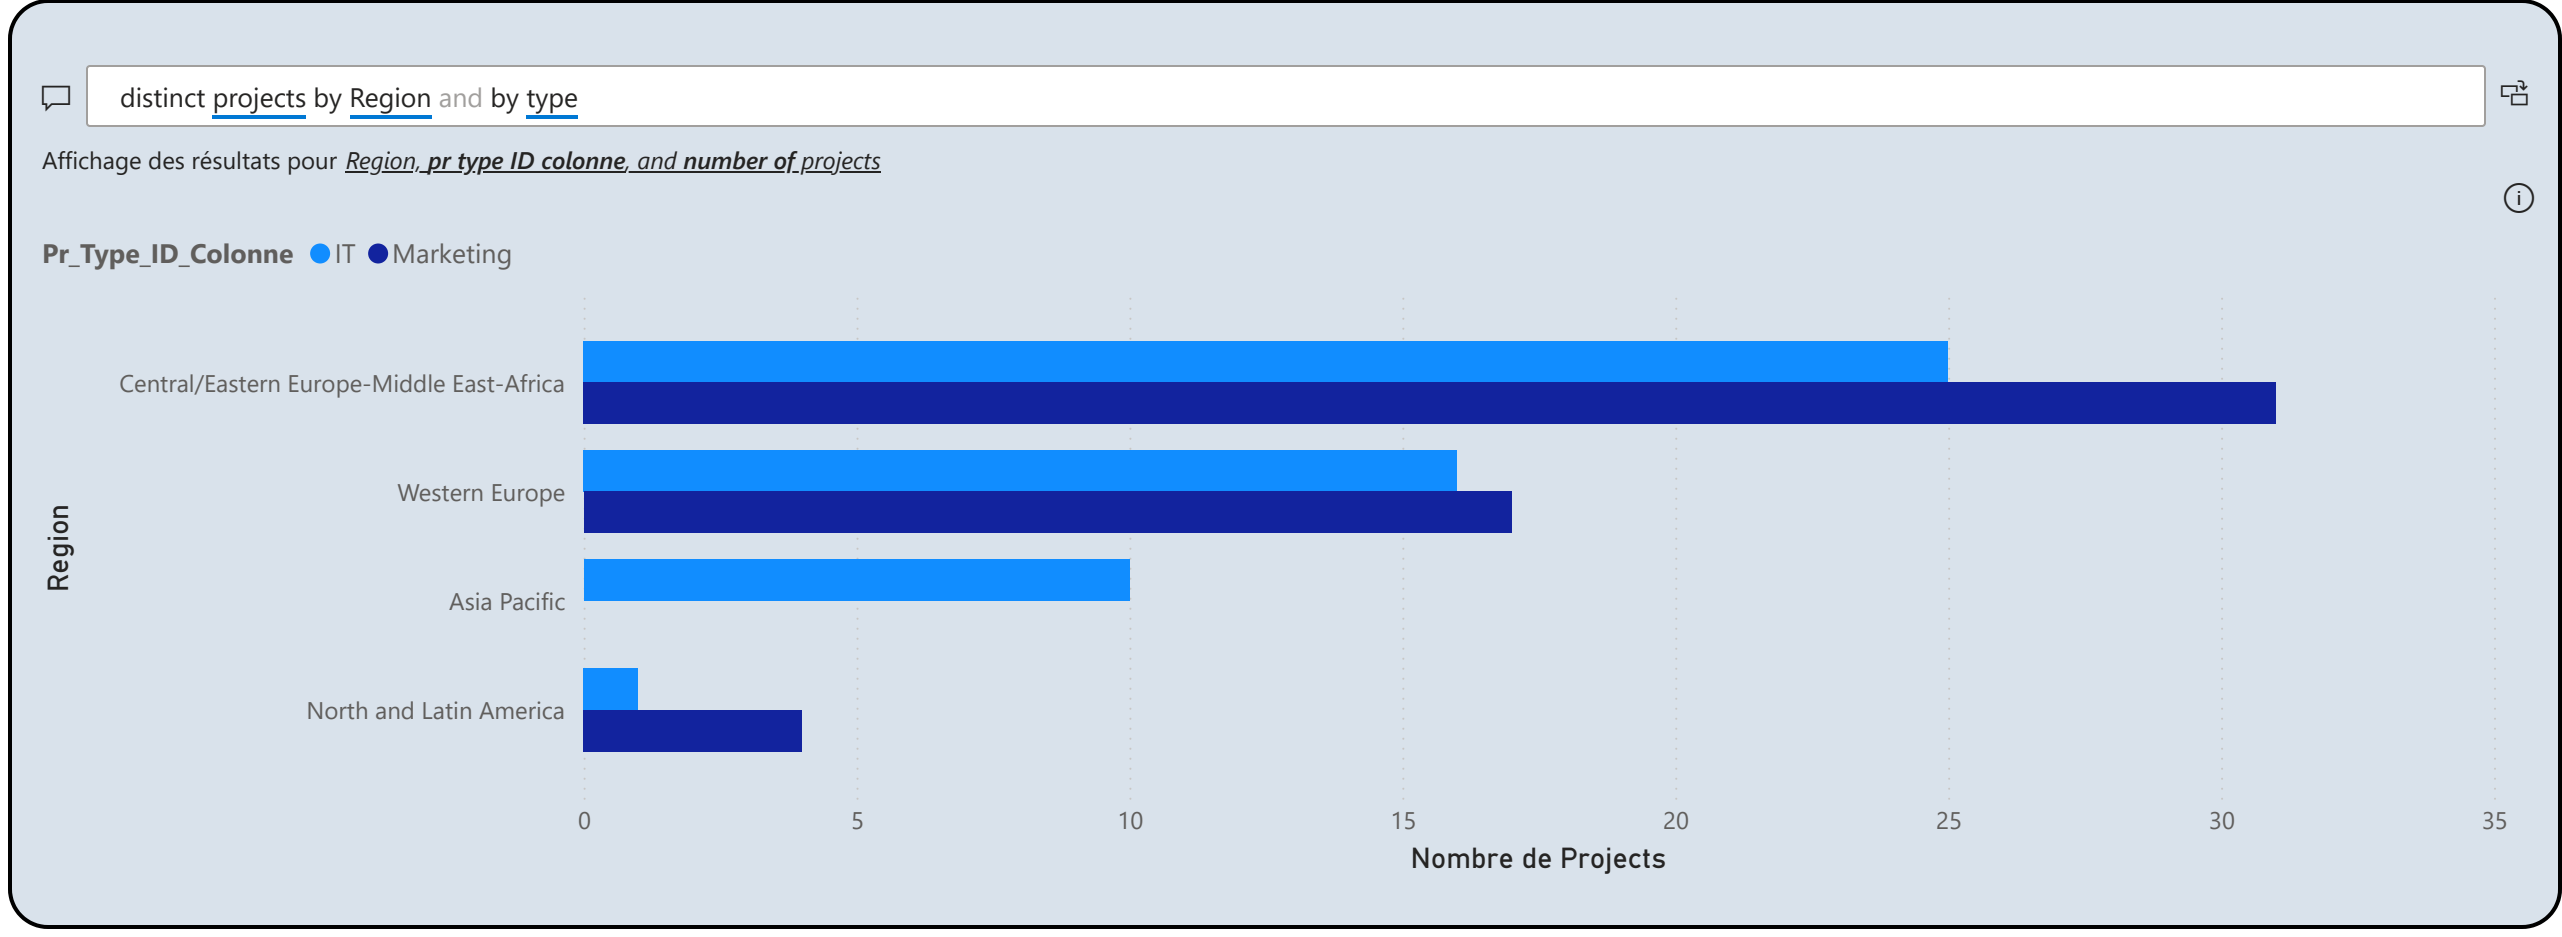

VUE PROJET

Region, Country

Tout

Statut Global Projet

Tout

Statut Cout Projet

Tout

Statut Durée Projet

Tout

Statut Livrables Projet

Tout

Project_ID

Tout

Statut Global Phase

Tout

Statut Cout Phase

Tout

Statut Durée Phase

Tout

Statut Livrables Phase

Tout

Project_Type

Tout

104

Nombre de Projets

520

Nombre de Phases

Project ID	Pr_Type_ID_Mesure	Country	Planned Cost	Rate Cost	Planned Duration	Rate Duration	Planned Deliverable	Rate Deliverable	Global Project Alert
1	Marketing	Equateur	750 000	121,4 %	469	94,5 %	76	97,4 %	Alerte
2	Marketing	France	1 500 000	86,2 %	365	83,0 %	71	88,7 %	OK
3	Marketing	Liban	750 000	124,5 %	398	116,3 %	73	93,2 %	Alerte
4	Marketing	Egypte	750 000	127,1 %	151	194,7 %	95	95,8 %	Alerte
5	Marketing	Afrique du Sud	750 000	101,3 %	435	68,0 %	59	96,6 %	OK
6	Marketing	Albanie	750 000	119,0 %	318	121,7 %	43	93,0 %	Alerte
7	Marketing	Pays-Bas	1 500 000	95,4 %	445	98,9 %	98	93,9 %	OK
8	Marketing	Allemagne	1 500 000	100,2 %	313	87,9 %	61	91,8 %	OK
9	Marketing	Belgique	1 500 000	113,9 %	346	76,3 %	46	91,3 %	OK
10	Marketing	Benin	500 000	94,1 %	171	112,5 %	82	95,2 %	OK
Total			56 108 000		52 722		8 735		

Project ID	Phase	Country	Planned Cost	Rate Cost	Planned Duration	Rate Duration	Planned Deliverable	Rate Deliverables	Global Phase Alert
1	Phase 1 - Planning	Equateur	50 000	119,2 %	196	100,0 %	10	100,0 %	Alerte
2	Phase 1 - Planning	France	100 000	86,7 %	16	100,0 %	6	100,0 %	OK
3	Phase 1 - Planning	Liban	50 000	131,6 %	91	136,3 %	26	100,0 %	Alerte
4	Phase 1 - Planning	Egypte	50 000	130,2 %	31	54,8 %	20	100,0 %	Alerte
5	Phase 1 - Planning	Afrique du Sud	50 000	105,2 %	11	227,3 %	3	100,0 %	Alerte
6	Phase 1 - Planning	Albanie	50 000	118,0 %	62	91,9 %	19	94,7 %	Alerte
7	Phase 1 - Planning	Pays-Bas	100 000	99,5 %	190	79,5 %	30	93,3 %	OK
8	Phase 1 - Planning	Allemagne	100 000	103,5 %	48	137,5 %	28	89,3 %	Alerte
9	Phase 1 - Planning	Belgique	100 000	120,5 %	173	78,0 %	12	83,3 %	Alerte
Total			56 108 000		52 722		8 735		

Analyses Complémentaires

Projets débutés entre le :

01/01/2018 31/05/2020

Projets achevés entre le :

20/07/2018 03/06/2022

Project_Type

Tout


Region

Tout


Country

Tout


Cout Total réel par Type

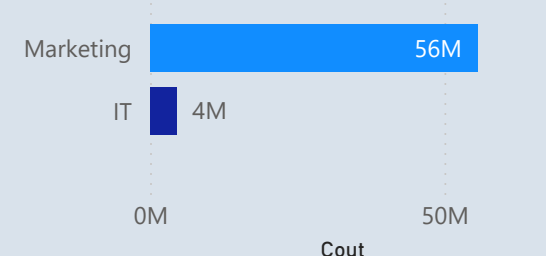


Durée Totale réelle par Type

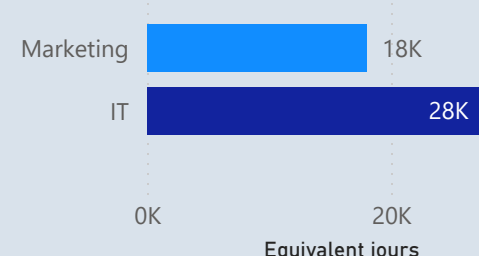

Livrables totaux réels par Type

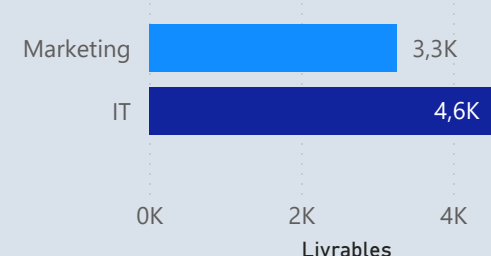


Cout Total réel par Phase

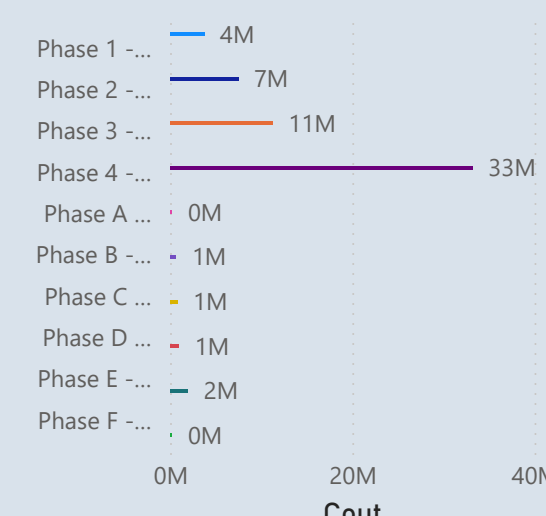


Durée Totale réelle par Phase




Livrables Totaux réels par Phase

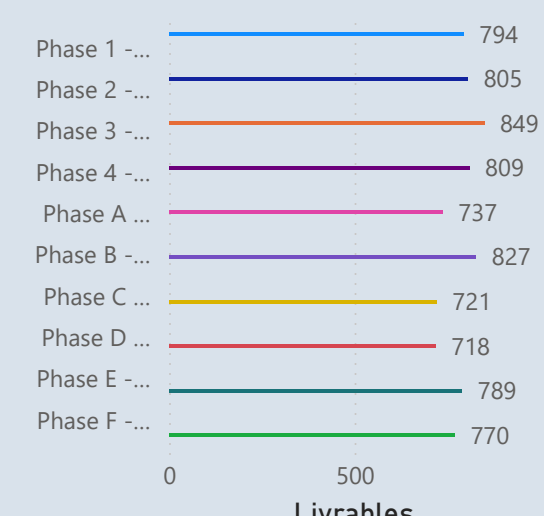


Cout total réel par Région

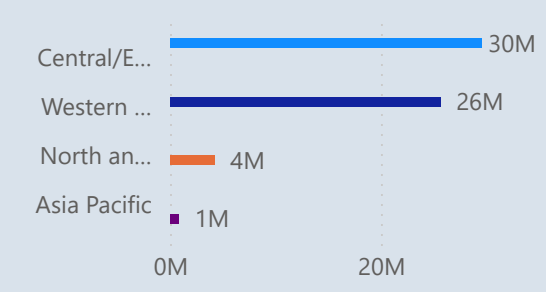

Durée Totale réelle par Région

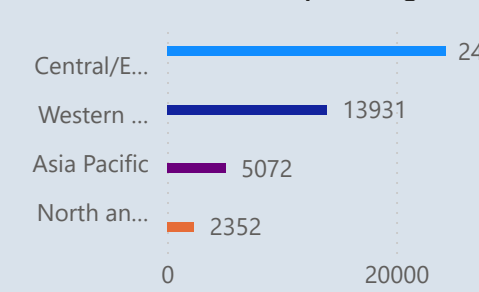


Livrables Totaux réels par Région

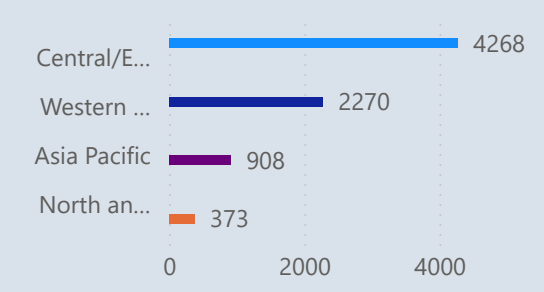

Posez votre question pour compléter ces informations :


what is the actual cost average by phase

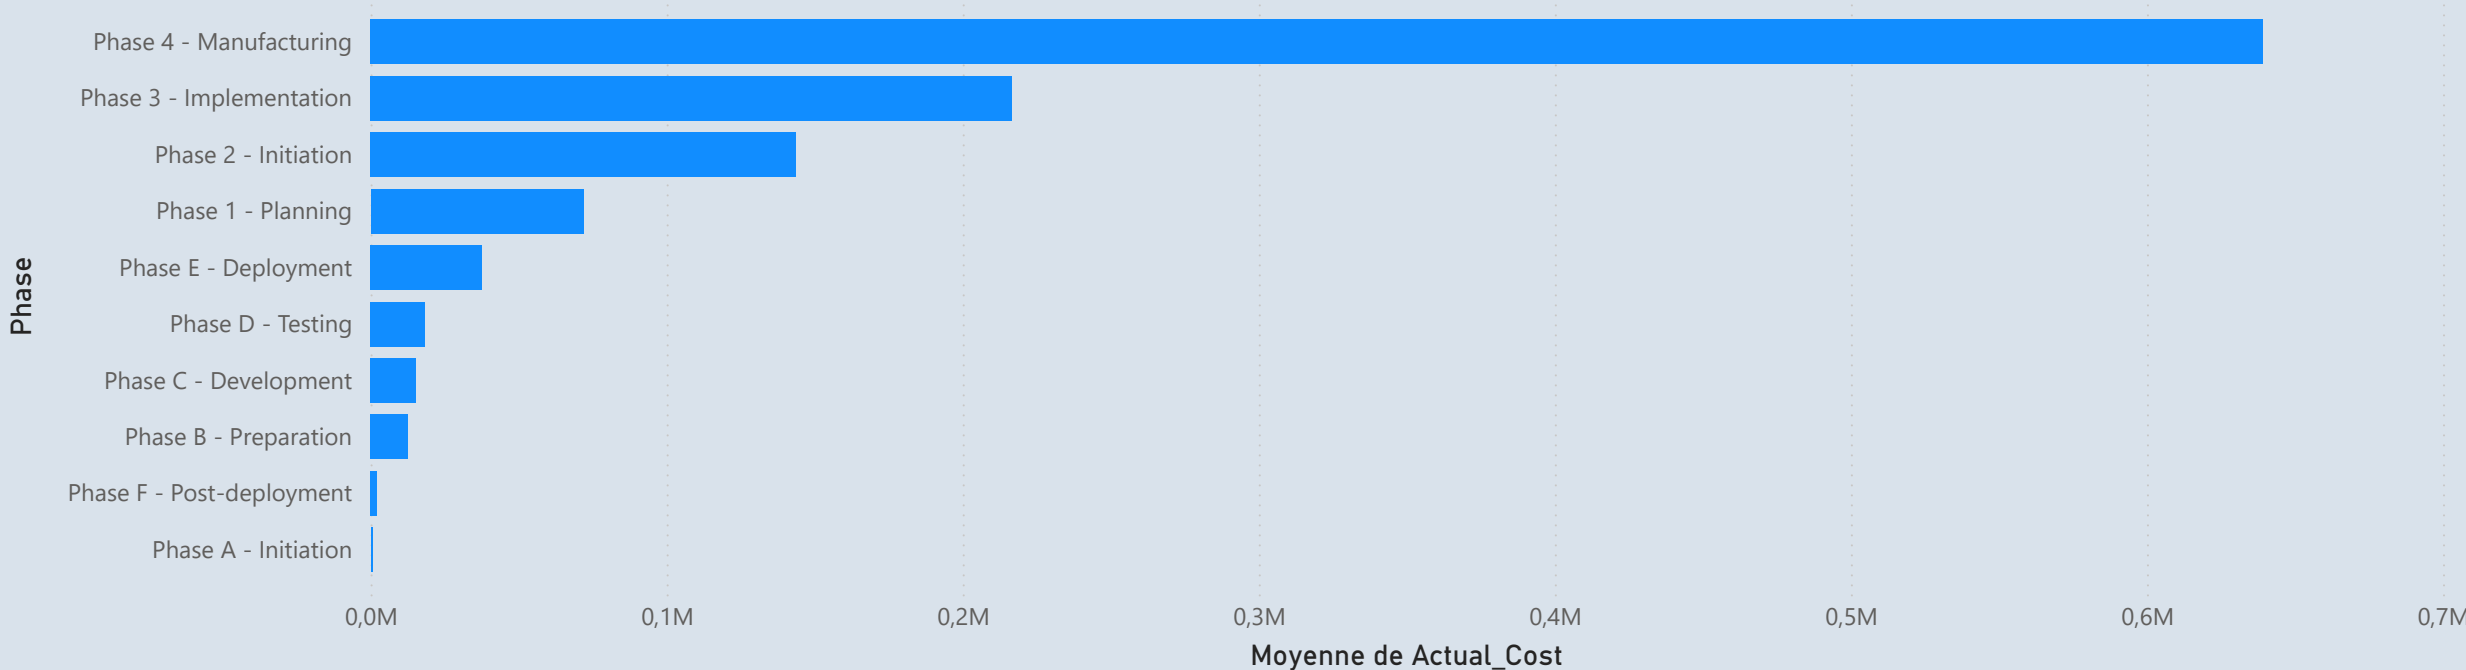

Influenceurs des Projets (Total et dépassement)


Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Cout réel de Projet pour Augmenter ?




Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Durée réelle de Projet pour Augmenter ?



Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Nbre de Livrables réel de Projet pour Augmenter ?



Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Taux de dépassement de Coût de Projet pour Augmenter ?



Aucun influenceur n'a été trouvé. Essayez d'ajouter d'autres champs dans « Expliquer par ».

Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Taux de dépassement de Durée de Projet pour Augmenter ?



Aucun influenceur n'a été trouvé. Essayez d'ajouter d'autres champs dans « Expliquer par ».

Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Taux de dépassement de Livrables de Projet pour Diminuer ?




Aucun influenceur n'a été trouvé. Essayez d'ajouter d'autres champs dans « Expliquer par ».

Influenceurs des Phases (Total et dépassement)


Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Cout réel de Phase pour Augmenter ?

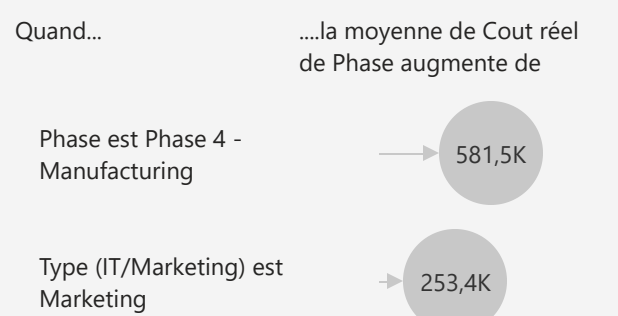

Influenceurs clés Top des segments


Ce qui influence Durée réelle de Phase pour Augmenter ?



Aucun influenceur n'a été trouvé. Essayez d'ajouter d'autres champs dans « Expliquer par ».

Influenceurs clés Top des segments


Ce qui influence Nbre de Livrables réel de Phase pour Augmenter ?



Aucun influenceur n'a été trouvé. Essayez d'ajouter d'autres champs dans « Expliquer par ».


Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Taux de dépassement de Coût de Phase Augmenter ?

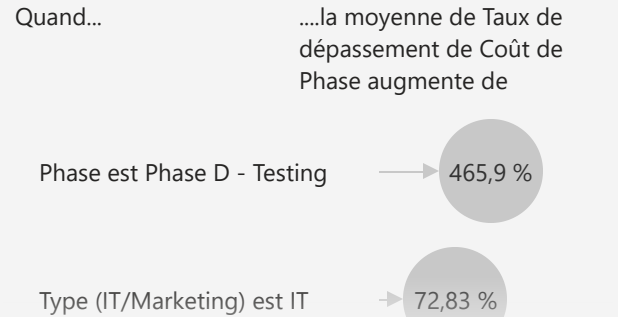

Influenceurs clés Top des segments


Ce qui influence Taux de dépassement de Durée de Phase pour Augmenter ?



Aucun influenceur n'a été trouvé. Essayez d'ajouter d'autres champs dans « Expliquer par ».

Influenceurs clés Top des segments

Ce qui influence Taux de dépassement de Livrable de Phase pour Diminuer ?




Posez votre question pour compléter ces informations :

distinct projets by type and by project rate deliverable status

Affichage des résultats pour Pr type ID colonne, pr rate deliverable status, and number of projects

Pr_Rate_Deliverable_Status Alerte OK

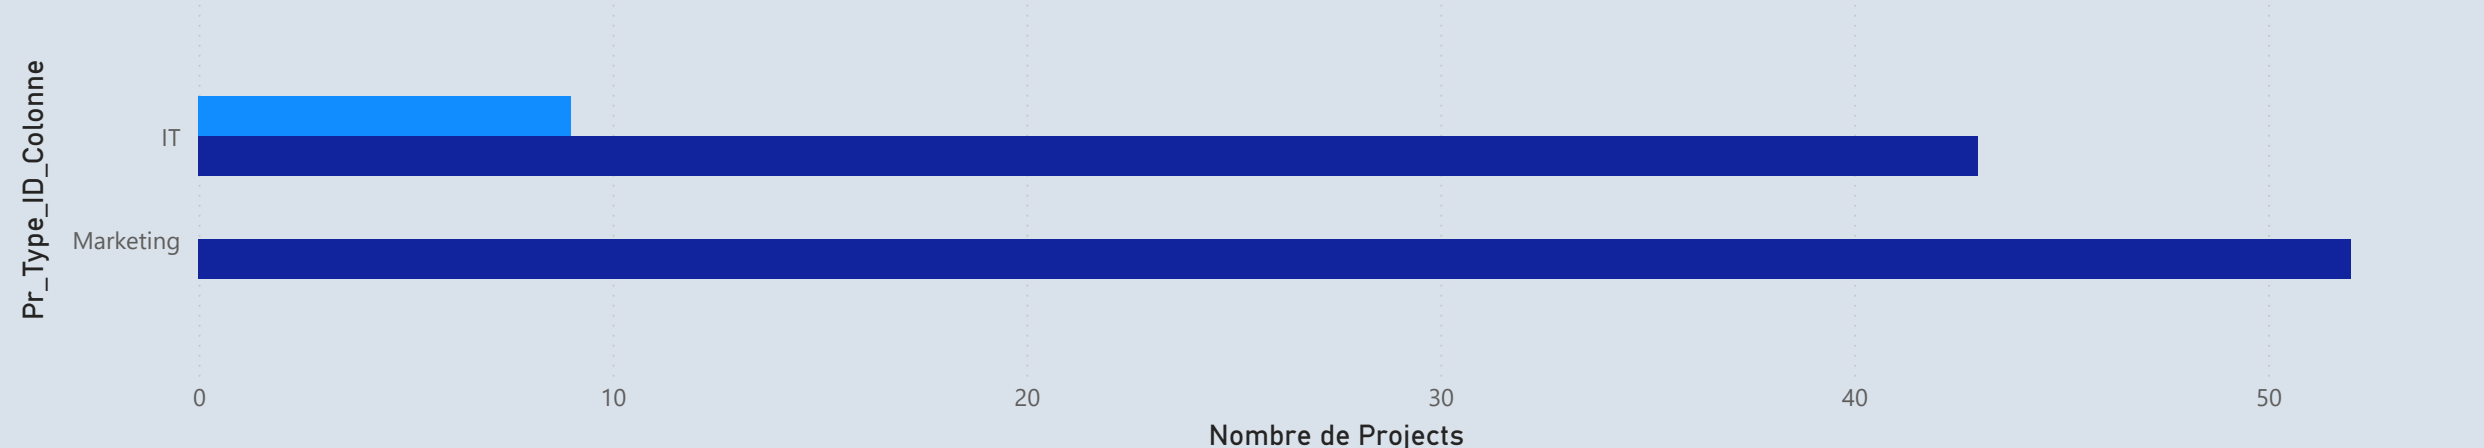

Recommandations



- ◆ **1. Gouvernance et Mise à Jour des Données :**
 - Définir une **fréquence d’actualisation** (ex. quotidienne, hebdomadaire)
 - Définir un **responsable des mises à jour** (données conformes avant intégration, et bonne intégration)
 - Définir un plan pour **conserver l'historique des données et des rapports**
 - Automatiser l’**actualisation des données** si nécessaire
- ◆ **2. Accès et sécurité :**
 - **Bien définir les niveaux d'accès** aux données de chaque utilisateur
 - **Revoir régulièrement** les droits d'accès
- ◆ **3. Formation et adoption du Dashboard :**
 - Organiser une **démonstration pour les utilisateurs finaux** et répondre à leurs questions.
 - Bien expliquer la **lecture des alertes** et l'**utilisation des filtres**.
 - **Accompagner les utilisateurs** dans leurs premières utilisation
- ◆ **4. Amélioration du fichier :**
 - **Recueillir les retours** pour améliorer le tableau de bord après quelques semaines d'utilisation.
 - **Prévoir un point de contact** en cas de questions ou d'améliorations à apporter.

Axes d'analyse



- ◆ **1. Performances mondiales :**
 - **Pas d'alerte Bilan Total** (projet-critères-ok compensent les projets-critères-dépassés)
(dépassement des couts 107% à surveiller et des livrables 89% de l'attendu)
 - Mais **2 projets sur 5 dépassent au moins 1 critère**
 - **2 projets dépassés sur 3 sont** concernés par le **cout**
 - ◆ **2. Impact géographique sur les performances :**
 - Globalement **moyenne régionales représentatives de la moyenne mondiale**
(Attention aux couts en CEE_MEA et Amériques, et aux livrables en West Europe)
 - =>Il s’agit donc plutôt de **suivre les écarts au niveau Pays**.
 - ◆ **3. Impact du type de projet (IT et Marketing) :**
 - Tx dépassement Global des projets IT (42%) > Tx de dépassement Global projets Marketing (37%).
 - **Tx de dépassement Coûts des projets Marketing** (35%) >>> Tx de dépassement Coûts projets IT (19%)
 - **Tx de dépassement Livrables des projets IT** (17%) >>> Tx de dépassement Livrables projets Marketing (0%)
 - ◆ **4. Analyse complémentaires et Influenceurs :**
 - **Couts des phases de Marketing** (notamment **phase 4-Manufacturing**) >>> Couts des phases de IT.
 - délais et livrables => Même ordre de grandeur pour chaque phase (IT, Marketing confondus) mais plus de phases pour IT.
 - Tx de dépassement Coûts et Livrables des phases IT (et notamment Couts de Phase D Testing) plus important.
Mais Couts réel des projets Marketing > >Couts réels projets IT.
 - pas d’impact de la Région ou Pays
- Remarque :
Voir si rentabilité des projets Marketing est proportionnelle aux couts.
- ◆ **5. Elements complémentaires :**
 - Pas de projet Marketing en Asie
 - **Projets Marketing lancés en 2018**
 - **Projets IT lancés en 2020.**
